


TG-8/10

NUME	TRIF MIHAI
REFERINTA	1
LOCALITATE	0




ONE Made by VEX

LUNGIME L1	1220	GLISANTE L1	1	1	610	GROSIME	TIP STICLA	DECUPAJ	MANERE	IMBINARI	CULOARE	CORNIERE	NR.BUCATI
INALTIME L1	1775	BATANTE L1	1	1		8mm	Clar	0	CU LANT	DIN ALUMINIU	ANTRACIT	20cu20	1
LUNGIME L2	2180	GLISANTE L2	3	3	545								
INALTIME L2	1775	BATANTE L2	1	1									
LUNGIME L3	1750	GLISANTE L3	2	2	583								
INALTIME L3	1775	BATANTE L3	1	1									
LUNGIME L4	1150	GLISANTE L4	1	1	575								
INALTIME L4	1775	BATANTE L4	1	1									

MONTAJ PE ZID 11.18 mp



ZONELE ROSII REPREZINTA POZITIA UNGHIIULUI DE 90 GRADE



OBSERVATII:

CORNIERE 20X40 - 6ML
 CORNIERE 20X20 - 6ML
 LATERALELE SE BLOCHEAZA PENTRU A NU FI DESCHISE
 DIFERENTA IN PARTEA DE JOS DE 10-25MM- NECESAR SILICON NEGRU

Data: 03.12.2025
Nume client: TRIF MIHAI
Numar telefon client:
Zona montaj: SIBIU (DEVENTER)
Coordonate (unde este cazul):

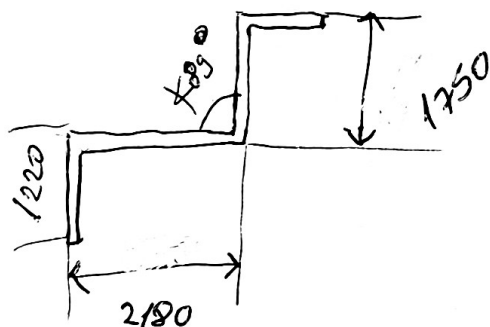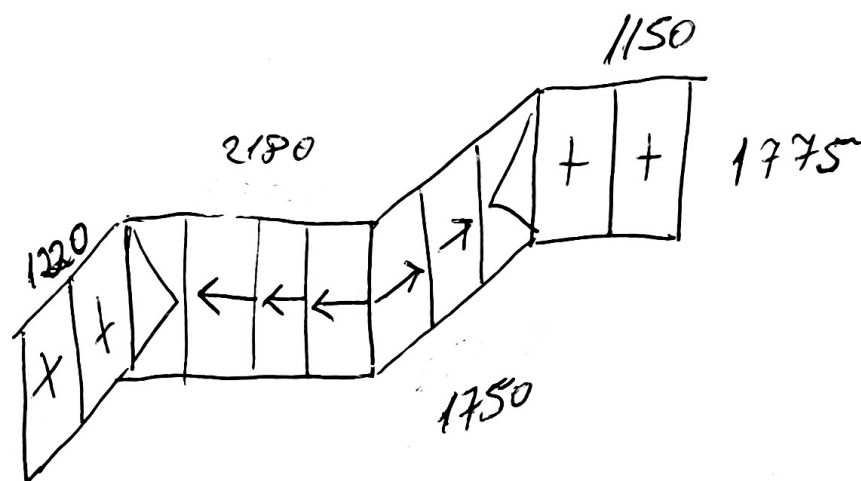

cotniera 20x40 - 6 ml
20x20 - 6 ml

- DIFERENȚĂ JOS 10-25 mm NECESAR SILICON NEGRU

- BALCONUL SE MONTEAZĂ PE GRESIE,

ÎN PROCESUL DE MONTARE EXISTĂ RISCUL DE SPARGERE AL GRESIEI, LUCRU CE A FOST TRANSMIS BENEFICIARULUI

Elemente necesare la masuratoare



Data: 03.12.2025
 Nume client: TRIF MIHAI
 Numar telefon client:
 Zona montaj: SIBIU
 Coordonate (unde este cazul) :

E pe gol lucrarea?	DA ☒ NU ☐
Cine va demonta tamplaria veche existenta?	Clientul ☐ ACITIM ☐ Nu este cazul ☒
Elemente de protectie la montaj	Folii protectie ☐ Aspirator ☐ Nu este cazul ☒ Alte elemente
Grosimea zidului:	28 - 36 cm
Cu cat se va placa pe exterior?	15 cm
La cati cm se va monta tamplaria la interior?	17 6 cm
Se doresc pervaze de interior ?	DA ☐ Latime(mm)?, Culoare?..... NU ☒
Se doresc pervaze de exterior?	DA ☐ Latime(mm)?, Culoare?..... NU ☒
Se doresc plase de insecte?	DA ☐ NU ☒
Se ia in calcul solbanc?	DA ☐ NU ☒
E sapa turnata?	DA ☒ NU ☐
Cat se va turna sapa? (cota finala cu gresie sau parchet)	Cota(cm) Nume si prenume (client/mester) Semnatura client/mester
Am luat cotele FINALE?	DA ☒ NU ☐
Daca am luat cotele finale, cat am scazut?	Latime(mm) 5 Inatime(mm)..... 10
Zidul este tencuit si finisat sau la rosu?	TENCUIT/FINISAT ☒ ROSU ☐
Partea de spaletarie e tencuita sau la caramida?	TENCUITA ☒ LA CARAMIDA ☐
Are clientul curent?	DA ☒ NU ☐
Este nevoie de generator?	DA ☐ NU ☒
Este vreo piesa la care se va mai zidi? GRESIE , DIFERENTA PANA LA 25mm	DA ☒ NU ☐
Ferestrele din aceeasi camera se vor egaliza pe inaltime?	DA ☒ NU ☐
In ce data(aproximativ) se doreste montajul?	Perioada :
Clientul va fi prezent la montaj?	DA ☒ NU ☐ Daca clientul NU va fi prezent la montaj,cine va face receptia? Nume si prenume Telefon

Am luat la cunostiinta toate elementele mai sus mentionate, pentru orice modificare sunt obligat sa anunt PANA LA LANSAREA IN PRODUCTIE A LUCRARI !

In 95% din cazuri, dup ace se lanseaza lucrarea la fabrica, nu se mai pot face modificari ulterior! MODIFICARILE DORITE ULTERIOR SUNT COSTURI SUPLIMENTARE SUPTORATE DE CLIENT.

Orice problema legata de goluri si modificari facute ulterior intra in responsabilitatea clientului (Ex: in cazul spargerii sau zidirii) .

STEFAN
 Nume si prenume agent,
 Semnatura agent,

Nume si prenume client,
 Semnatura client,
